


▲実績 15 海山町下水管敷設工事

図面

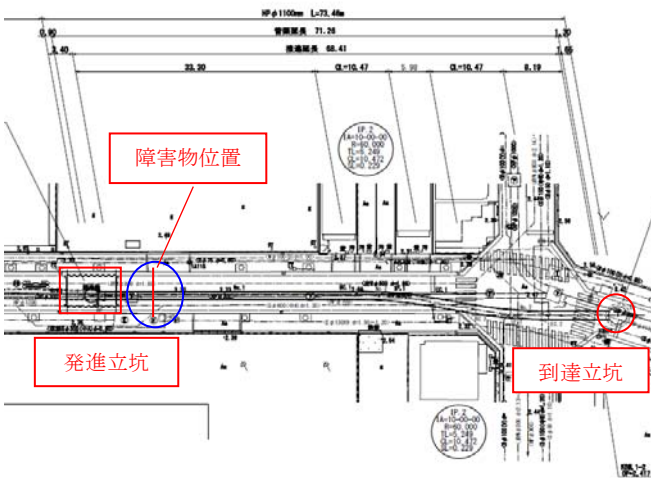

φ1100mm ミリングモール掘進機

工事概要

施工場所：大阪府堺市
 呼び径：φ1100mm
 推進延長：69.840m (60R 2カーブ)
 土質：(砂質土)
 N 値：4~9
 礫率：- %
 最大礫径：57 mm
 地下水位：GL-1.98m
 土被り：6.149m

地中障害物：
 鋼矢板Ⅲ型 1箇所

工期：昼間施工(8.0h)
 1ヶ月(2015.8~2015.9)

推進管路部に鋼矢板Ⅲ型が1箇所存在すると考えられる。
 推進管を布設する当該道路が交通量の多い幹線道路であり道路の規制が困難である為この存置鋼矢板Ⅲ型を切削する工事である。

施工結果、鋼矢板Ⅲ型を1箇所切削しました。



排出した金属片



排出した金属片



排出した金属片



排出した金属片
