


▲実績 赤羽台団地公共下水道その1工事

図面

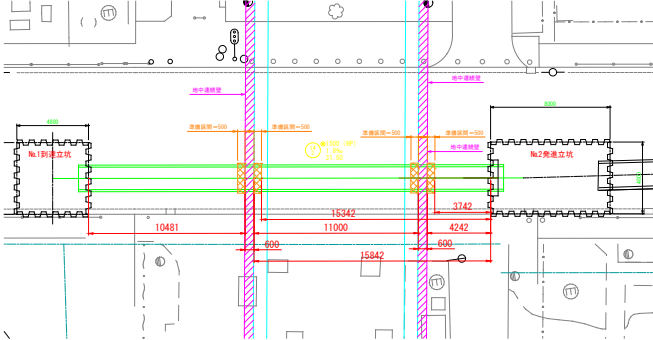

工事概要

呼び径：φ1500mm  
 推進延長：26.9m  
 土質：粘土混り砂()  
 N値：15～15  
 礫率： - %  
 最大礫径： mm  
 地下水位：GL-9.956m  
 土被り：9.63～9.63m

地中障害物：

想定

地中連続壁 2か所

壁の中のH鋼 400X400 計2本

実施工

地中連続壁 2か所

壁の中のH鋼 400X400 計2本

H鋼 400X400 1本

金属物 150mm 1本

工期：昼間施工(9.0h)

3ヶ月

(2016.12～2017.2)

当初、推進路線部に地中連続壁2か所が確認されているためミリングモールでの施工となりましたが、地中連続壁2か所H鋼450mm、金属物150mm切削しました。

φ1500mm ミリングモール掘進機



排出した金属片



マシン到達状況

