



▲実績46 台東区上野七丁目、東上野三丁目付近再構築工事

図 面 :

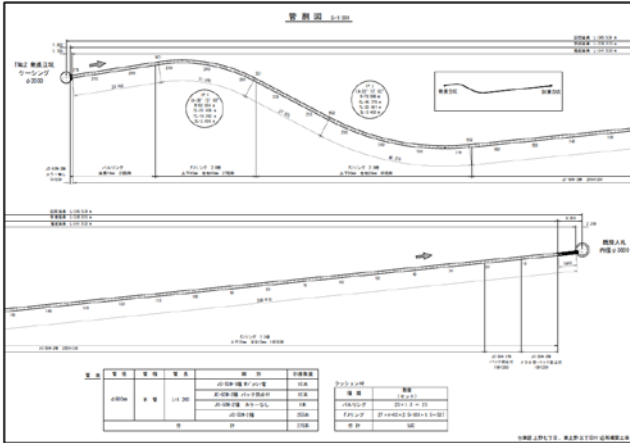


φ800mmミリングモール掘進機

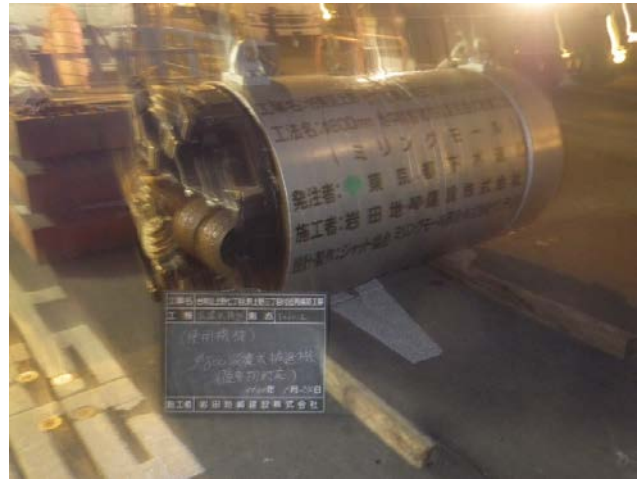

【工事概要】

施工場所：東京都台東区上野
 呼び径：φ800mm
 推進延長：340.91m
 土質：砂・シルト
 N値：12
 礫率：%
 最大礫径：mm
 地下水位：GL-2.1m
 土被り：20.115m
 工期：施工夜間車上7(h)
 : 10ヶ月
 : 2018/1/12~2018/11/5

発進立坑内全景

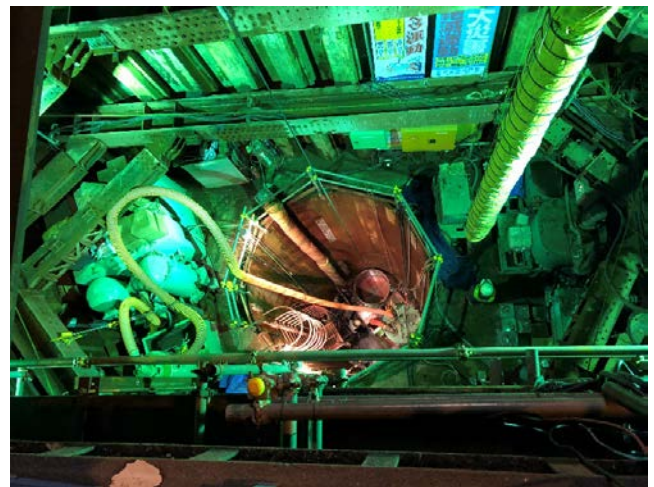


地中障害物：保険方式

:
 :
 :

夜間作業状況全景

コメント：

夜間施工・車上&路下プラント・土被り20m以上・
 φ3500からの小発進・半管施工・急曲線
 (R=50m)・到達BOXを設置しての人孔到達・掘進
 機殺し、特殊づくしの現場であった。障害物への
 接触は無く無事工事を完了した。

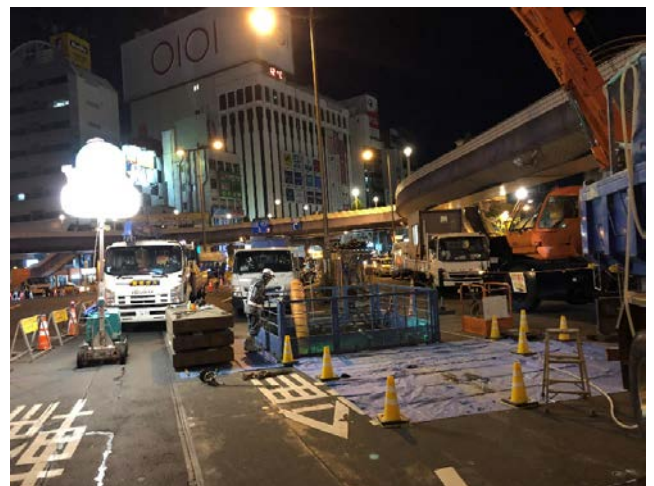

▲実績46

掘進機到達狀況(到達BOX)



掘進機解体状况



掘進機解体完了

