


▲実績69 市川南第4排水区雨水管渠布設工事(R0201)

図 面 :



φ mmリングモールド掘進機

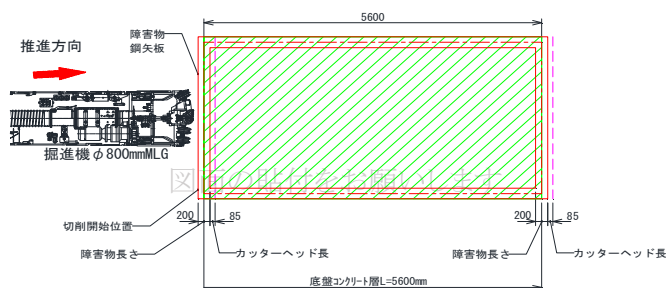

【工事概要】

施工場所：千葉県市川市

呼び径：φ800mm

推進延長：182.734m

土質：砂質土

N値：0～3

礫率：0%

最大礫径：-mm

地下水位：GL-0.9m

土被り：平均3.65m

工期：施工(h) 昼間:夜間施工

：18ヶ月

：2021/3/8～2022/9/8

地中障害物：残置立坑(鋼矢板Ⅱ型・ベースCON)

切削延長1箇所目：4.885m

切削延長2箇所目：5.500m

切削延長3箇所目：4.300m

コメント

当初設計より切削量が増えたため、中間立坑を2箇所設けてビット交換を2回行い対応した。

