


▲実績76 足立区千住緑町、千住橋戸町付近再構築工事

図 面：



$\phi 1200\text{mm}$ ミリングモール掘進機

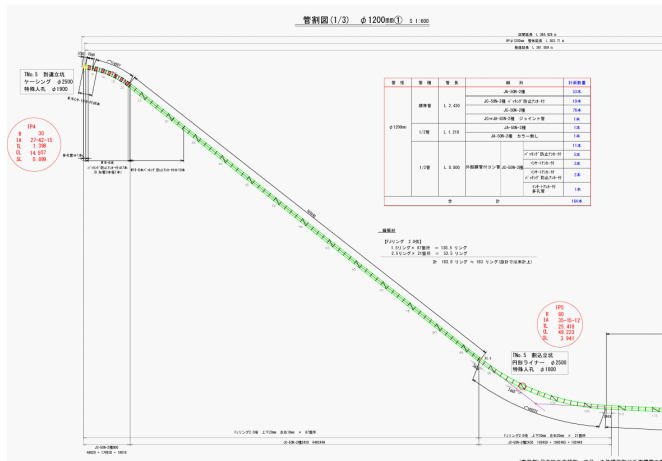

換気設備

【工事概要】

施 工 場 所： 東京都足立区
 呼 び 径： $\phi 1200\text{mm}$ $R=80, R=30$
 推 進 延 長： 361.587m
 土 質： 粘性土・砂質土
 N 値： 5.5
 礫 率： 0%
 最 大 礫 径： 0mm
 地 下 水 位： GL-3.05m
 土 被 り： 7.351m
 工 期： 施工(7h) 昼間施工
 ： 5ヶ月
 ： 2022年9月12日～2023年2月17日
 地中障害物： 障害物なし



監視設備

コ メ ン ト：

- ・メタンが発生する可能性があったが検知されませんでした
- ・ $\Phi 1200$ のスパンは自動ガス検知器の設置と換気設備による24時間の換気を行った
- ・保険方式での施工だったが、障害物には当たらなかった

