


▲実績82 東村山市野口町一丁目地先から同市本町二丁目地先間配水本管
(500mm・400mm新設工事)

図 面：

φ 1000mmミリングモール掘進機

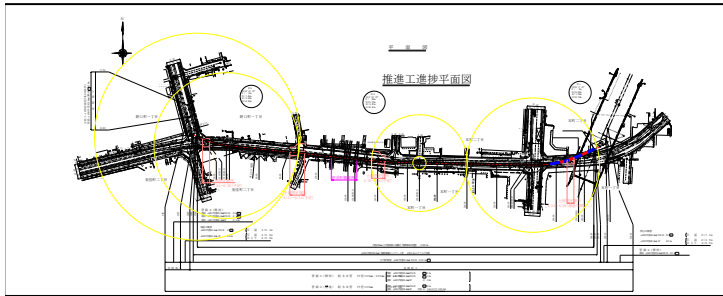

【工事概要】

施 工 場 所：東京都東村山市

呼 び 径：φ 1000mm

推 進 延 長：269.49m

土 質：砂礫土

N 値：30～34

礫 率：70%

最 大 礫 径：80mm

地 下 水 位：GL-8.6m

土 被 り：9.555m

工 期：施工(8h) 昼夜間施工

：5ヶ月

：2024/04/01～2024/08/28

地中障害物：障害物1か所

：H型鋼その他

：

：

コ メ ン ト：

障害物には4か所当たる想定であったが、3か所目だけ当たった。障害物はH型鋼の他にねじ切り鋼管と思われる物も出現した。また、最大礫径は80mmの想定であったが200mmぐらいの礫が多数出現した。



▲実績82

