


▲実績84 送水管布設工事

図 面 :



φ 900mmリングモール掘進機

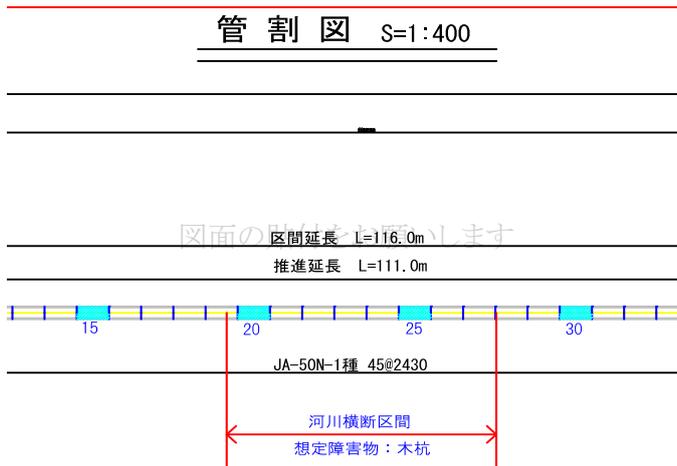

掘進機到達完了

【工事概要】

- 施工場所 : 岡山県玉野市
- 呼び径 : φ 900mm
- 推進延長 : 111.000m
- 土質 : 粘性土
- N値 : 2~13
- 礫率 : 21%
- 最大礫径 : 60mm
- 地下水位 : GL-2.20m
- 土被り : 5.48m
- 工期 : 施工(8h) 昼間施工
- : 2ヶ月
- : 2024/11/26~2025/1/22



- 地中障害物 : 木杭(想定)
- : 鉄筋棒、ピアノ線(実際)
- :
- :

掘進機回収状況

コメント :

河川区間進入時土質がシルト層~埋戻砂層に変わり当初想定されていた障害物(木杭)ではなく鉄筋棒等が排出されましたが問題なく施工は行えました。



▲実績84

排出した障害物



排出した障害物



排出した障害物

