


▲実績86 元船町・出島町(径700耗)配水管推進工事

図 面 :



φ 900mmミリングモール掘進機

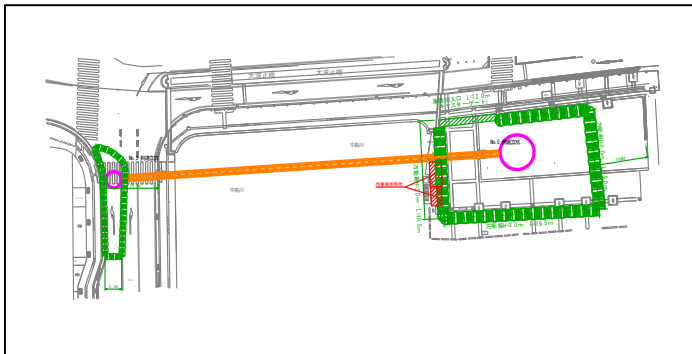

【工事概要】

施 工 場 所 : 長崎県長崎市

呼 び 径 : φ 900mm

推 進 延 長 : 71.8m

土 質 : 砂、粘土、礫

N 値 : 0~9

礫 率 : 5%

最 大 礫 径 : 60mm

地 下 水 位 : GL-1.38m

土 被 り : 16.03m

工 期 : 施工(8h) 昼夜間施工

: 2ヶ月

: 2024/09/26~2024/11/29

地中障害物 : 無し

:

:

:

コ メ ン ト :

障害物には遭遇しなかったが、高深度、高水圧の
為施工が困難だった。



▲実績86

