


# ▲実績42 八戸(変)バイオマス連系他土木工事

図 面 :



φ 1000mmミリングモール掘進機

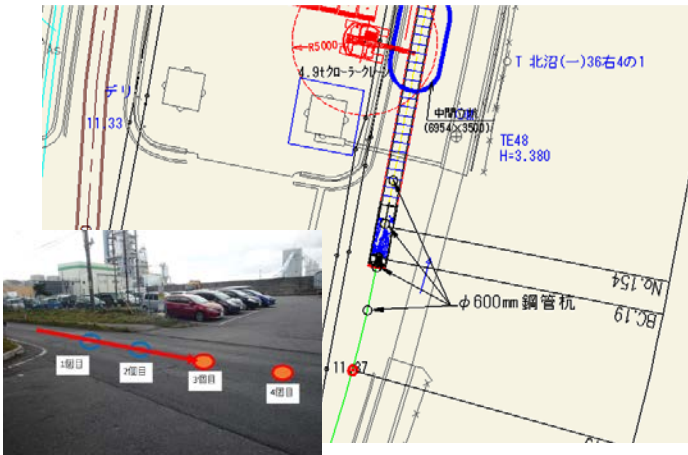

φ 1000mmミリングモール掘進機検尺



## 【工事概要】

施工場所：青森県八戸市

呼び径：φ 1000mm

推進延長：218.791m

土質：シルト混じり砂

N値：6～7

礫率：5%

最大礫径：15mm

地下水位：GL-1.80m

土被り：4.820m

工期：昼夜施工(16.0h)

：2ヶ月

：2018.4.23～2018.6.28

地中障害物：鋼管杭 φ 600mm 4箇所

：

：

：

コメント：


基線上に昔の用水路が有り駐車場に乗り入れの為の橋がありました。その基礎杭として鋼管杭(φ 600mm)が4本あり、高架下の交差点で入口が駐車場の為、開削が出来ないのでリングモール工法で切削する事になりました。

掘進機内(伸縮管)切削状況



▲実績42

障害物切削 切削片確認(金属片)

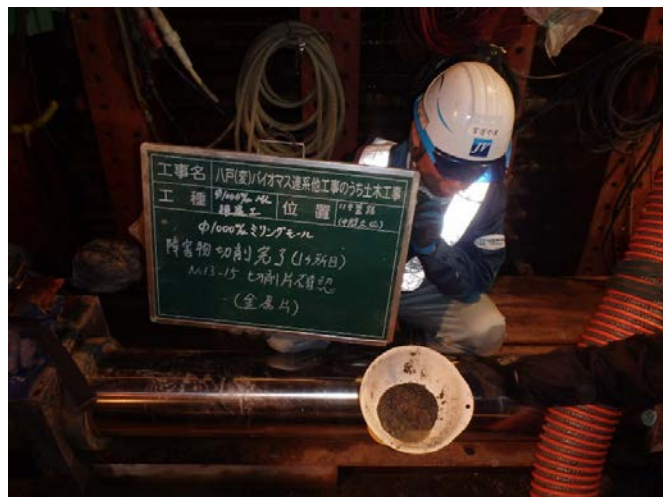

障害物切削 切削片確認(金属片)

障害物切削 切削片確認(金属片)



障害物切削 切削片確認(金属片)



障害物切削 切削片確認(金属片)



障害物切削 モニタリング状況

