


▲実績55 千里浄水池更新工事(新2号池)



φ800mmミリングモール掘進機

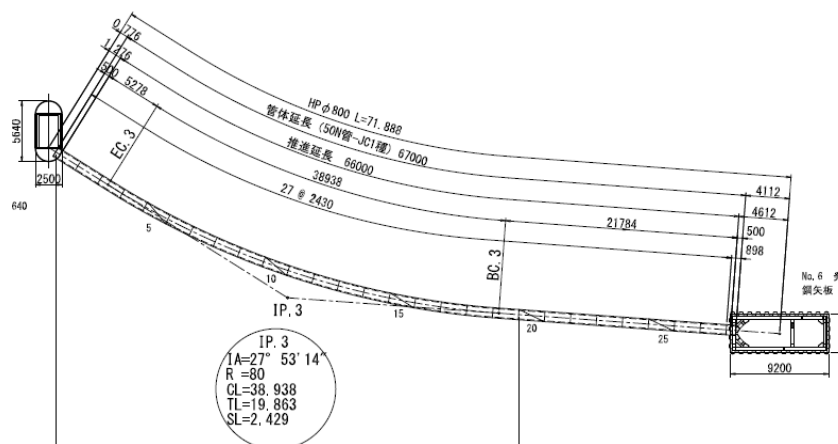

【工事概要】

施工場所：大阪府箕面市

呼び径：φ800mm

推進延長：66.00m

土質：硬質粘土

N値：35

礫率：0%

最大礫径：6mm

地下水位：GL-2.5m

土被り：9.6m

工期：施工(h)

：2ヶ月

：令和2年2月25日～令和2年4月10日

地中障害物：保険方式

：地中障害物無

：

：

コメント：

推進管路上部に既設水道管φ1350mmが離隔約1.0mで平行して埋設されており、保険方式で施工したが、障害物には接触せず、到達する。

