


▲実績61 南大阪湾岸流域下水道泉北送泥管築造工事(R1-1)

図 面 :



φ mmミリングモール掘進機

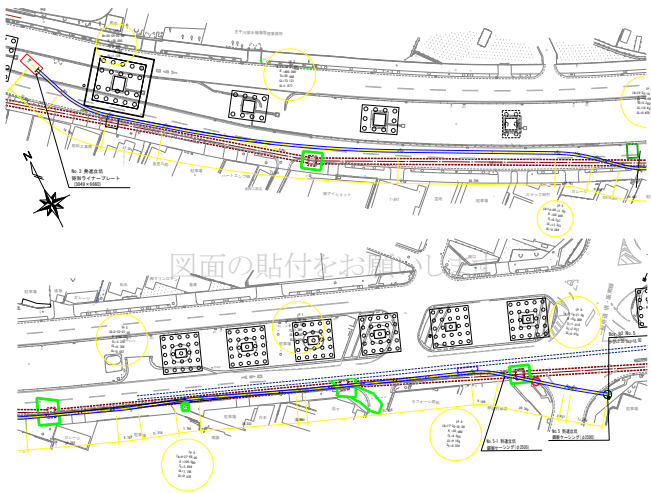

【工事概要】

施工場所：大阪府泉大津市助松町
 呼び径：φ800mm
 推進延長：381.20m
 土質：砂質土・砂礫土
 N値：5～60
 礫率：36%
 最大礫径：120mm
 地下水位：GL-3.10m
 土被り：発進1.9m 到達12.8m
 工期：昼夜間施工
 ：8ヶ月
 ：令和2年11月4日～令和3年7月7日

地中障害物：モルタル鋼杭

:
 :
 :
 :
 コメント：

不明障害物に接触 協議の上切削しました。
 ビットの摩耗を考慮し、ビット交換を実施。

中間到達状況



ビット交換



▲実績61



到達状況

