



# ▲実績50 公共下水道島頭第1管渠築造工事(3)

図 面 :

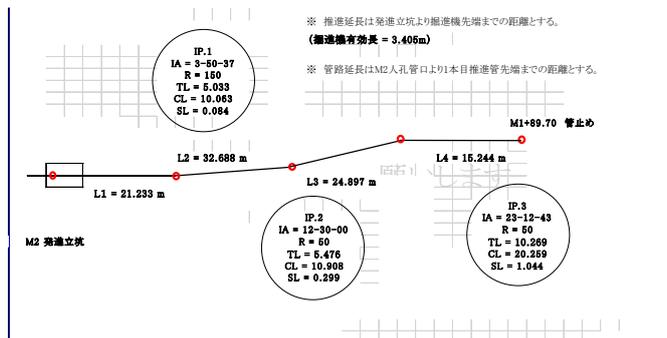

φ mmミリングモール掘進機

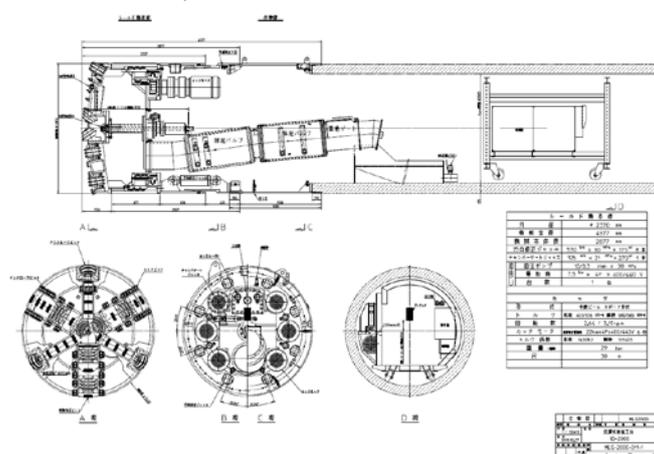

## 【工事概要】


- 施工場所：大阪府門真市千石東町
- 呼び径：φ 1500mm
- 推進延長：87.190m
- 土質：砂混りシルト
- N値：0
- 礫率：0%
- 最大礫径：0'mm
- 地下水位：GL-1.59m
- 土被り：8.90m
- 工期：施工(h)  
：3ヶ月  
：平成31年4月8日～令和1年7月21日
- 地中障害物：残置鋼矢板にあたる可能性がある

既設推進管と掘進機



## コメント：

当現場は地中障害物により推進中止となった推進管の下部まで到達側よりミリングモール工法にて掘進を行い、削進により接合させるという施工です。

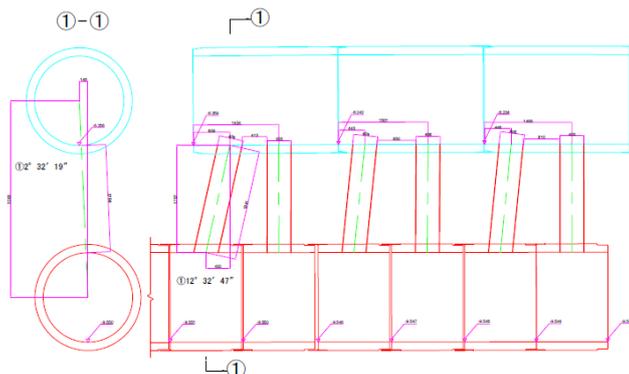

## ▲実績50

工事現場は市バスの停留所に隣接しているため、最終バスが出た後に掘進機を搬入します。

掘進機搬入



掘進機坑内吊り降ろし



掘進完了後、マシン内部を解体します



レンガにて閉塞



中込め注入を行って施工完了です

