


▲実績51 公共下水道茨木摂津排水区管渠布設工事28-4工区

図 面 :



φ 1800mmミリングモール掘進機

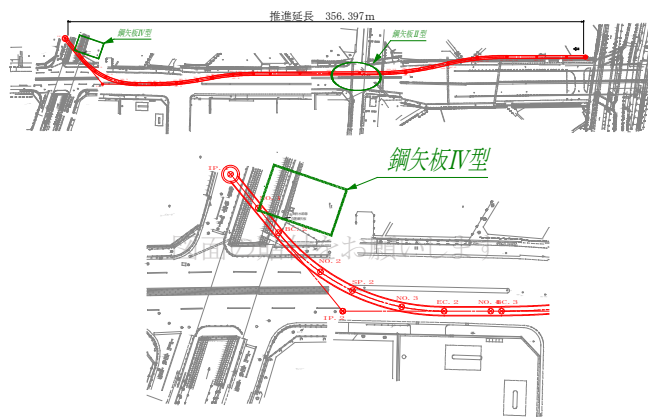

【工事概要】

施工場所：大阪府摂津市鳥飼八丁目付近

呼び径：φ 1800mm

推進延長：359.397m

土質：砂質土

N値：25.6

礫率：0%

最大礫径：57mm

地下水位：GL-1.47m

土被り：5.82m

工期：施工(h)

：11ヶ月

：平成30年11月7日～令和元年9月

地中障害物：鋼矢板(IV型) 計画 3.850m

：鋼矢板(II型) 計画 0.625m

：追加 鋼矢板 1.24m

：

コメント：

到達付近薬液注入工施工時に障害物に接触
設計の検討 ミリングモール工法で施工に
なりました。

鳥飼推進存置鋼矢板手前に 予定外障害物あり
追加で1.24mの切削を施工(カーブ区間)



▲実績51

摘出物



摘出物



掘進機到達状況

