


▲実績53 第4次広井町幹線ほか下水道築造工事

図 面 :



φ 900mmミリングモール掘進機

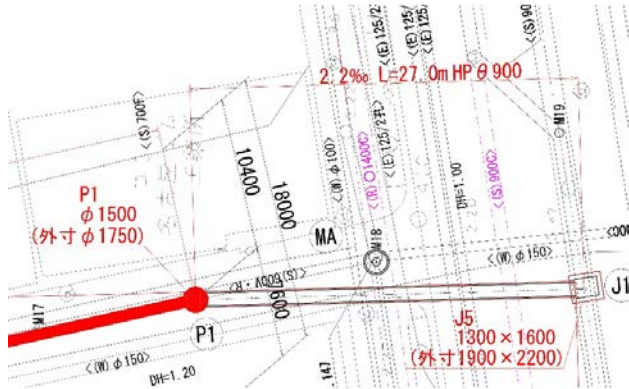

【工事概要】

施工場所 : 名古屋市中川区運河町地内

呼び径 : φ 900mm

推進延長 : 22.4m

土質 : 砂質土

N 値 : 2.7

礫率 : 0%

最大礫径 : 5.7mm

地下水位 : GL-2.4m

土被り : 3.184m

工期 : 施工(h)

: 3ヶ月

: 令和元年10月25日～令和2年1月

地中障害物 : φ 1400mmコンクリート管

: φ 900mmコンクリート管

:

:

コメント :

設計自体に障害物が承認されていたのでコンクリート管の排土状況の立会写真等の確認はしていません。



▲実績53

