


▲実績63 (仮称)八重洲二丁目北地区電気・熱供給事業プラント建設工事

図 面 :



φ mmリングモールド掘進機

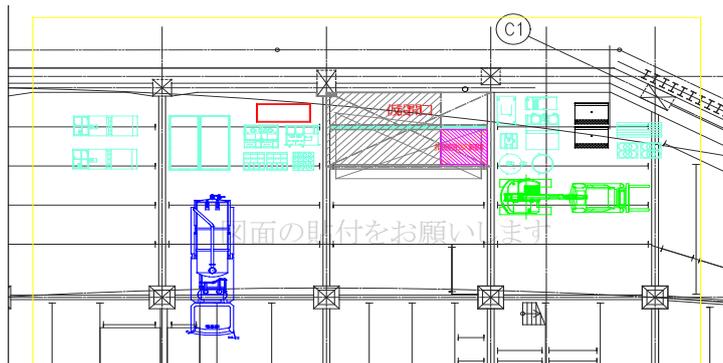

【工事概要】

施工場所：東京都中央区

呼び径：φ1650mm

推進延長：40.4m

土質：砂礫土

N値：50

礫率：%

最大礫径：50'mm

地下水位：GL-13.2m

土被り：20m

工期：施工8(h)20:00~5:00

：4ヶ月

：2021/5/17~2021/8/28

地中障害物：無し

：

：

：

コメント：

障害物に接触は無し

