


▲実績67 飼料穀物コンビナート線ケーブル張替工事のうち土木工事

図 面 :



φ 800mmミリングモール掘進機

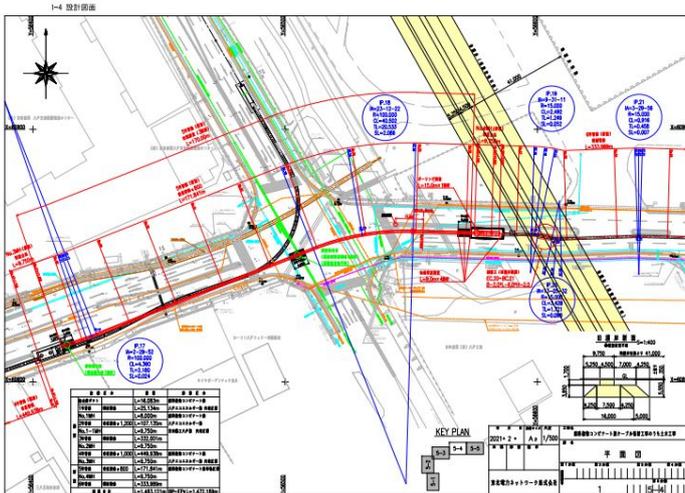

【工事概要】

施工場所 : 青森県八戸市
 呼び径 : φ 800mm
 推進延長 : 170.291m
 土質 : 砂質土
 N値 : 9
 礫率 : 30%
 最大礫径 : 150mm
 地下水位 : GL-2.67m
 土被り : 7.58m
 工期 : 施工(h) 昼夜間施工
 : 3ヶ月
 : 2021/12/8~2022/3/3

地中障害物 : シートパイル

:
 :
 :

コメント :

当初、コンクリート杭も切削予定だったが、結果的に到達前のシートパイルだけだった。真っすぐ正面に当たる感じだったので、順調に切削できた。

