


▲実績72 低区御池連絡幹線配水管布設工事(その7-2)他工事

図 面：



φ800mmリングモール掘進機

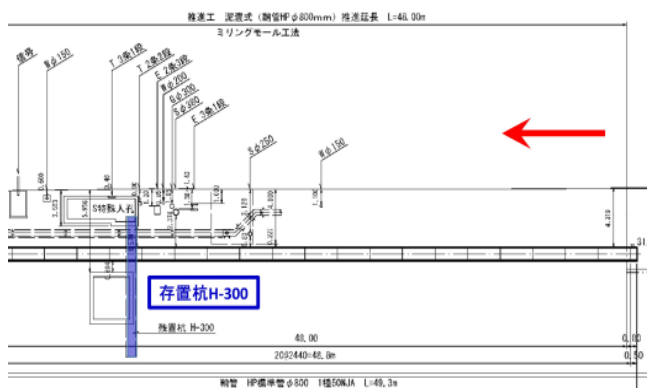

【工事概要】

施 工 場 所：京都府京都市中京区

呼 び 径：φ800mm

推 進 延 長：48.0m

土 質：砂礫土

N 値：60

礫 率：66%

最大礫径：120'mm

地下水位：GL-3.61m

土 被 り：4.2m

工 期：施工8(h) 昼間:夜間施工

：1.2ヶ月

：2023/2/20～2023/3/31

地中障害物：保険方式(接触無)

：

：

：

コ メ ン ト：

残置杭(300H鋼材)がある可能性があった為に
リングモール工法(保険方式)を採用

障害物(300H鋼材)に接触しなかった為に、通常
で到達しました。

