


▲実績73 低区御池連絡幹線配水管布設工事(その7-2)他工事

図 面 :



φ1100mmミリングモールド掘進機

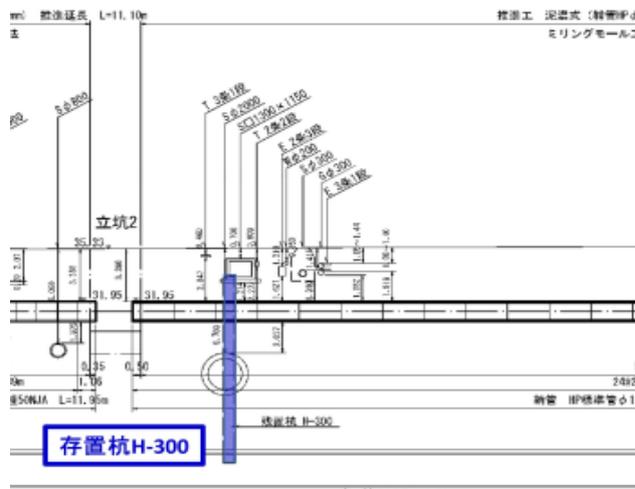

【工事概要】

施工場所：京都府京都市中京区

呼び径：φ1100mm

推進延長：60.863m

土質：砂礫土

N値：60

礫率：66%

最大礫径：120' mm

地下水位：GL-3.61m

土被り：3.5m

工期：施工(h) 昼間:夜間施工

：1.2ヶ月

：2023/10/4～2023/11/17

地中障害物：保険方式(接触無)

：

：

：

コメント：

残置杭(300H鋼材)がある可能性があった為に

ミリングモールド工法(保険方式)を採用

障害物(300H鋼材)に接触しなかった為に、通常
で到達しました。

