


▲実績74 大江戸線大門駅～大門変電所間ケーブル洞道整備工事

図 面：



φ 2200mmミリングモール掘進機

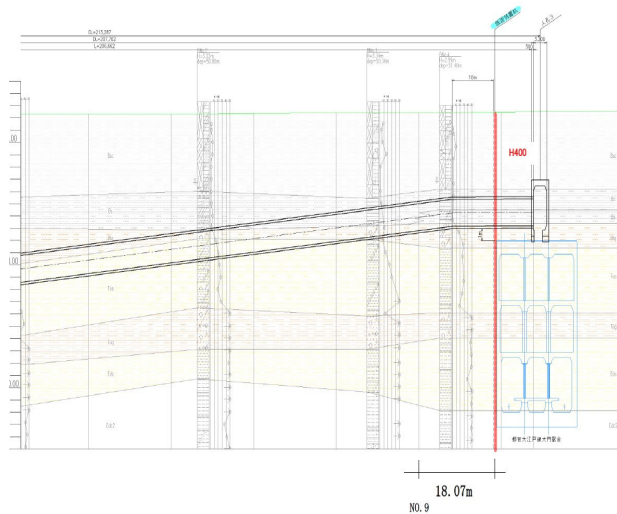

【工事概要】

施 工 場 所：東京都港区浜松町2丁目3番

呼 び 径：φ 2200mm

推 進 延 長：203.663m

土 質：砂質土

N 値：平均24

礫 率：0%

最 大 礫 径：19'mm

地 下 水 位：GL-8.47m

土 被 り：12.559～6.918m

工 期：施工16(h) 昼夜間施工(切削時)

：8.5ヶ月

：2022/10/17～2023/7/29

地中障害物：H400×4ヵ所(断面)

：
：
：

コ メ ン ト：

設備等は全て路下に設置。地上では、建造物の構築が有る事から、開口作業等の時間制約が有り変則的な作業時間で施工を行いました。また、切削期間については、当初の予定よりも進捗が悪く(H鋼の並びやカッターヘッドとの噛み合い)約2倍の切削時間が掛かりましたが、無事に到達する事が出来ました。

