


▲実績78 足立区千住緑町、千住橋戸町付近再構築工事

図 面：

φ 900mmミリングモール掘進機

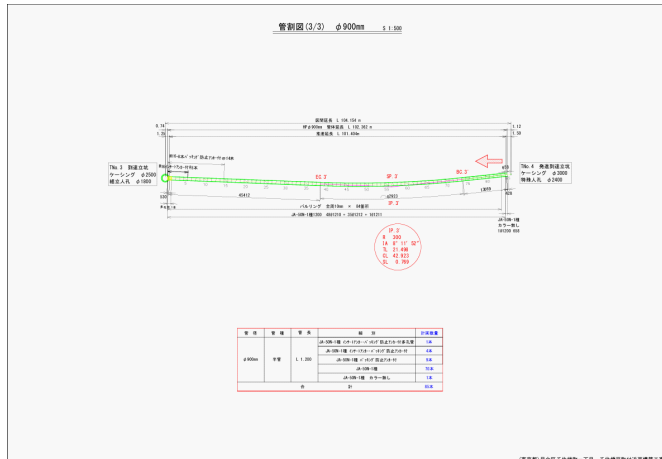

【工事概要】

施 工 場 所：東京都足立区

呼 び 径：φ 900mm R=300

推 進 延 長：101.404m

土 質：粘性土・砂質土

N 値：14.5

礫 率：0%

最 大 礫 径：0mm

地 下 水 位：GL-0.96m

土 被 り：5.732m

工 期：施工(7h) 昼間施工

：3ヶ月

：2023年7月31日～2023年11月10日

地中障害物：なし

：

：

：

コ メ ン ト：

小立坑発進での施工
