


▲実績81 鳴門市・北島町共同浄水場整備事業の内外構工事

圖面：



φ 800mmミリングモール掘進機

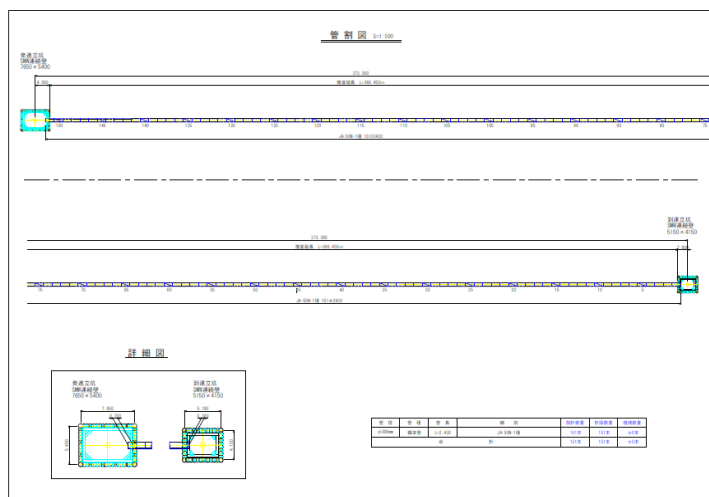

【工事概要】

施 工 場 所 : 徳島県鳴門市

呼び径：φ800mm

推進延長：366.45m

土 質 : 砂質土

N 值 : 17

礫 率 : 4%

最大礫径：20mm

地下水位：GL-1.20m

土 被 り : 13.22m

工 期：施工(8h) 昼間施工

: 3ヶ月

: 2024年1月9日～2024年4月10日

地中障害物：流木(保険方式)

•

•

.

コメント：

当工事の課題は河川横断と流木(径20センチぐらい)の出現の想定でしたが、流木の出現もなく想定していた工期通り施工し、最終精度もズレがなく到達できた。

