


▲実績82 鳴門市・北島町共同浄水場整備事業の内外構工事

図 面：



φ 800mmミリングモール掘進機

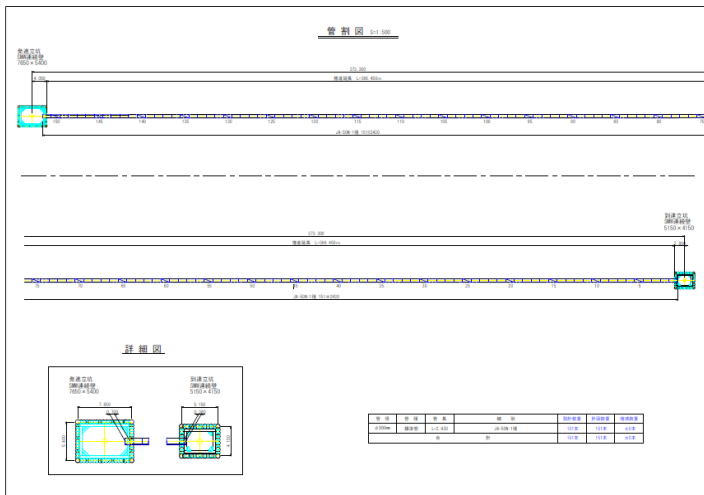

【工事概要】

施工場所：徳島県鳴門市

呼び径：φ 800mm

推進延長：366.45m

土質：砂質土

N値：17

礫率：4%

最大礫径：20mm

地下水位：GL-1.20m

土被り：13.22m

工期：施工(8h) 昼間施工

：3ヶ月

：2024年1月9日～2024年4月10日

地中障害物：流木(保険方式)

：

：

：

コメント：

当工事の課題は河川横断と流木(径20センチぐらい)の出現の想定でしたが、流木の出現もなく想定していた工期通り施工し、最終精度もズレがなく到達できた。

