


▲実績83 松本駅構内中条跨線橋付近横断管路新設工事

図 面 :



φ 800mmミリングモール掘進機

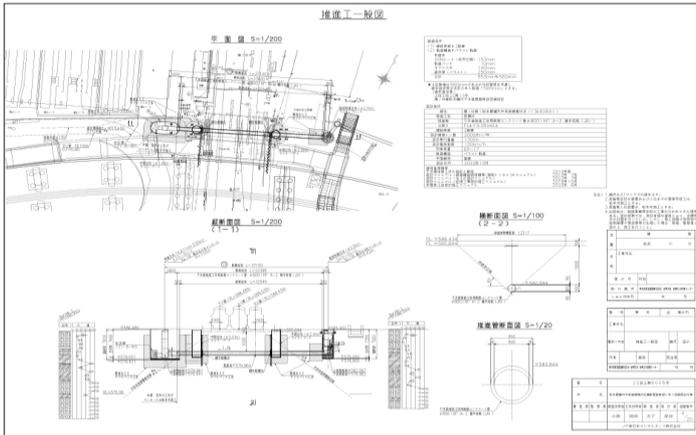

【工事概要】

施工場所 : 長野県松本市
呼び径 : φ 800mm
推進延長 : 32.545m
土質 : 砂・シルト
N値 : 10~14
礫率 : 0%
最大礫径 : 0mm
地下水位 : GL-1.5m
土被り : 5.604m
工期 : 施工(8h) 昼夜間施工
: 2ヶ月
: 2024/4/1~2024/5/25

地中障害物 : 保険方式

:
:
:

コメント :

JR線路下を保険方式で施工
線路下推進時は線閉作業
障害物には接触無し
