


▲実績 13 中央区日本橋掘留町一丁目地先から同区日本橋久松町地先間配水本管(800mm・500mm)布設替工事

図面

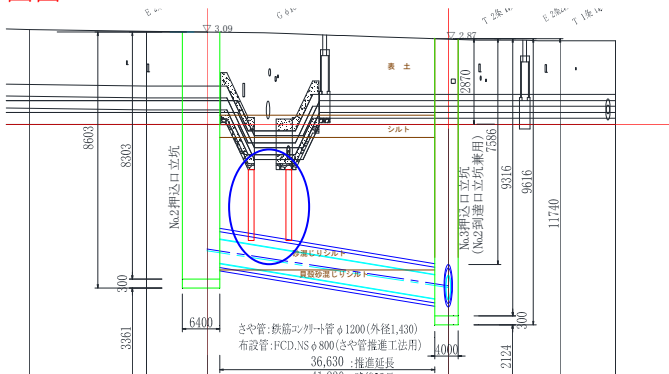

φ 1200mm ミリングモールド掘進機

工事概要

施工場所：東京都中央区

呼び径：φ 1200mm

推進延長：L=36.628m(120R 1カーブ)

L=133.936m(120R 150R 2カーブ)

土質：(砂混じりシルト)

N値：1～4

礫率： - %

最大礫径： - mm

地下水位：L=36.628m 区間 GL-2.25m

L=133.936m 区間 GL=2.4m

土被り：L=36.628m 区間 7.06m

L=133.936m 区間 4.1m

地中障害物：保険方式

木杭 φ 300 が存在する可能性

工期：昼間施工(8.0h)

2.5ヶ月(2015.5～2015.7)

当初、推進管路部に木杭φ300が存在する可能性がありました。

施工結果、木杭φ300はありませんでした。
