


▲実績45 東村山浄水場内原水連絡管(2000mm)新設工事

図 面 :



φ 2200mmミリングモール掘進機

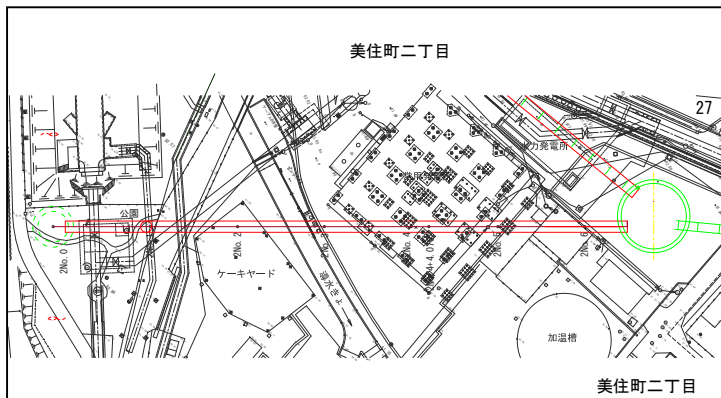

【工事概要】

施工場所：東京都東村山市

呼び径：φ 2200mm

推進延長：125.91m

土質：砂礫、シルト

N値：44.25

礫率：36%

最大礫径：400mm

地下水位：GL-5.55m

土被り：16.652m

工期：施工(h)

：3ヶ月20日

：2018.7.9～2018.10.30

地中障害物：

：無し

：

：

コメント：
