▲実績77　足立区千住緑町、千住橋戸町付近再構築工事

図　　面：

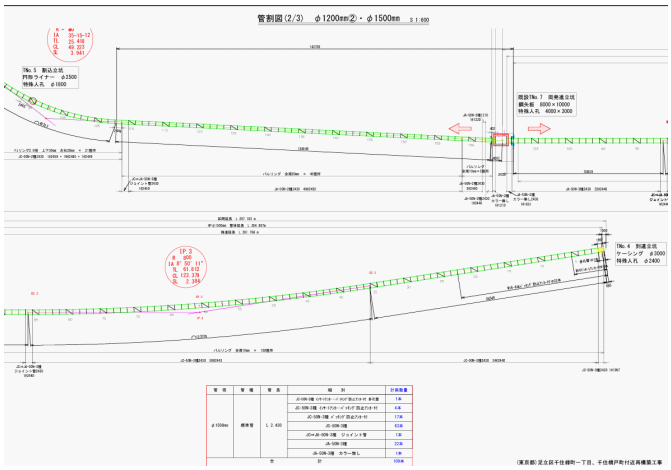

φ1500㎜ミリングモール掘進機

【工事概要】

施工場所：東京都足立区
呼び径：φ1500㎜　R=800
推進延長：261.767m
土質：粘性土･砂質土
N値：5.5
礫率：0%
最大礫径：0mm
地下水位：GL-3.05m
土被り：8.07m
工期：施工(7h)　昼間施工
：4ヶ月
：2023年2月17日～2023年6月27日
地中障害物：なし
：
：
：

コメント：
･坑内クレーン､トラバーサーを使用し施工した。
･掘進機の自沈もなく施工できた
･保険方式での施工だったが､障害物には当たらなかった
