▲実績85 公共下水道第2工区工事(その2)

図　　面：

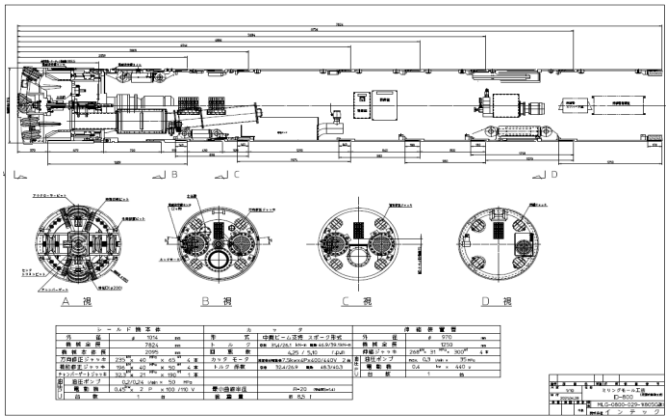

φ800㎜ミリングモール掘進機

【工事概要】

施工場所：大阪府泉佐野市
呼び径：φ800㎜
推進延長：65.33m
土質：砂質土
N値：6
礫率：10%
最大礫径：57mm
地下水位：GL-2.62m
土被り：5.1m
工期：施工(7h)昼間施工
：2ヶ月
：2024/2/26～2024/4/25
地中障害物：不明鋼管φ150
：
：
：

コメント：
不明鋼管に接触し、小口径推進が中断した為、中間立坑を設置し、続きをミリングモールに変更して施工を行うことになりましたが、推進中は鋼管や障害物との接触はありませんでした。
